

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA Y CUARTA ETAPA), INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISIÓN DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA DRENAJE SANITARIO DE 36" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 42" Ø, A UBICARSE EN EL KM. V-0336+013.35 DE LA LÍNEA "V", TRAMO TOTALCO - XALAPA, CORREDOR MÉXICO - VERACRUZ (VÍA XALAPA).

NO. DE OBRA

04812022000181
04812022000023
04812023000038
04812023000023
04812023000078

LOCALIZACIÓN

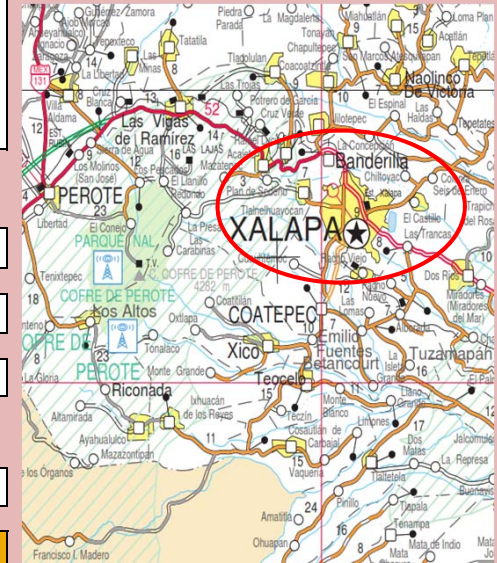

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

XALAPA

LOCALIDAD

XALAPA

REGIÓN

CAPITAL

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-013/2022-DGCOP
SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP
SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP

COSTO DEL CONTRATO

\$ 187,759,521.86

AUTORIZADO 2023

\$ 119,609,887.23

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

50.24%

AVANCE FINANCIERO

50.24%

TRAMITADO HASTA 2022

\$ 68,149,634.63

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

TRAMITADO EN 2023

\$ 26,188,448.32

POR TRAMITAR

\$ 93,421,438.91

FECHA DE CORTE

31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

PRELIMINARES (DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CARGA A CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS), OBRAS COMPLEMENTARIAS DRENAJE PLUVIAL (APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, SUB-RASANTE CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTE DE BANCOS), DRENAJE SANITARIO, MADRINA, COLECTOR PLUVIAL, CAJAS COLADAS EN SITIO CON Y SIN REJILLA, TRAGATORMENTAS. CRUCE DE COLECTOR CON VÍAS DE FFCC (MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL).

