


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**OBRA**  
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA).

**NO. DE OBRA**  
02082022000258  
02082023000272  
02082023090272  
02082023091272

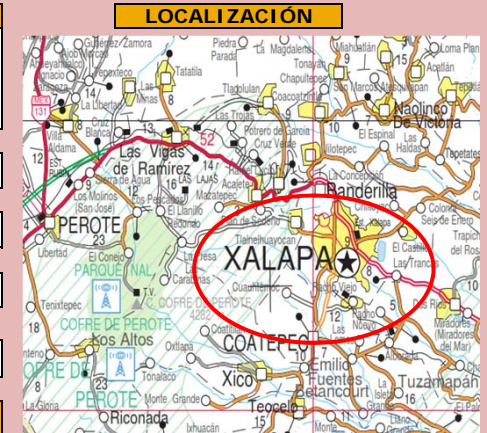

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** XALAPA

**LOCALIDAD** XALAPA-ENRÍQUEZ

**REGIÓN** CAPITAL

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
IEEV-CREDRE-2022-033  
IEEV-LIBREDISPOSICION-2023-017

**COSTO DEL CONTRATO** \$ 729,121,288.45

**AUTORIZADO 2023** \$ 550,836,909.58

**AVANCES**

**AVANCE FÍSICO U.P.** 36.46%

**TRAMITADO HASTA 2022** \$ 178,284,378.87

**TRAMITADO EN 2023** \$ 87,375,385.91

**POR TRAMITAR** \$ 463,461,523.67

**FECHA DE CORTE** 31 DE AGOSTO DE 2023

**METAS**

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO, DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, DESPALME DEL TERRENO A MÁQUINA), TERRACERÍAS (EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MEDIOS MECÁNICOS), ACARREOS SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO, CIMENTACIÓN, ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y DADOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRAS, CONCRETOS, PILAS DE CIMENTACIÓN, PLACA BASE COLUMNA, LOSA ESTACIONAMIENTO, ESTRUCTURA DE EDIFICIO, MONTAJES, CONEXIONES EN VIGAS Y COLUMNAS, UNIONES DE RAMPAS, TRANSICIÓN DE COLUMNAS EN RAMPAS, DIAGONALES, LOSACERO, ADHERIDOS, DRENAJE SANITARIO INTERIOR.

**AVANCE FINANCIERO** 36.44%

UNIDAD EJECUTORA

**INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**

