


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VERACRUZ.

NO. DE OBRA
02482022000018

LOCALIZACIÓN

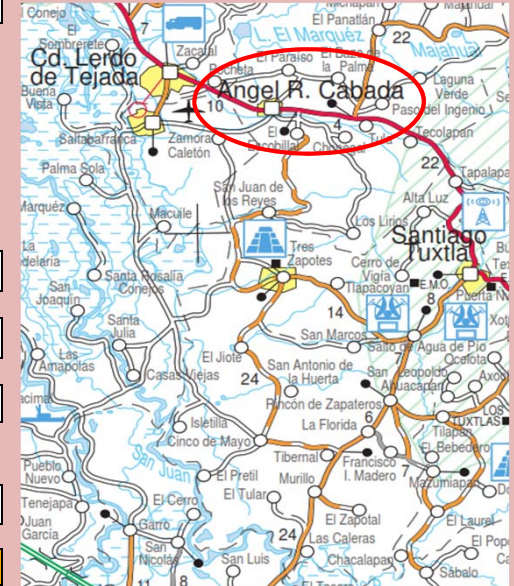

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO ANGEL R. CABADA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
PMA/HIDROMARÍTIMAS/02482022000018

LOCALIDAD ANGEL R. CABADA

COSTO DEL CONTRATO \$ 30,165,935.48

REGIÓN PAPALOAPAN

\$ 30,165,935.48

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 35.00%

AVANCE FINANCIERO 17.93%

TRAMITADO EN 2023 \$ 5,407,648.86

UNIDAD EJECUTORA
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

POR TRAMITAR \$ 24,758,286.62

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

METAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO EN VIALIDADES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BAÑOS Y VESTIDORES, BIODIGESTOR, CISTERNA, CASETA DE VIGILANCIA, ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, BODEGA DE HERRAMIENTAS, DRENAJE LIXIVIADOS, POZA DE ALMACENAMIENTOS DE LIXIVIADOS, OBRA CIVIL "CIMENTACIÓN" NAVE DE TRANSFERENCIA 50 X 35 ML, SUPER ESTRUCTURA ARCO TECHO, BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE NAVE INDUSTRIAL, POZO DE ABSORCIÓN, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CASETA DE BOMBAS, SISTEMA DE BOMBEO, ETC.

