


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**OBRA**  
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**NO. DE OBRA**  
04812021000147  
04812023000062

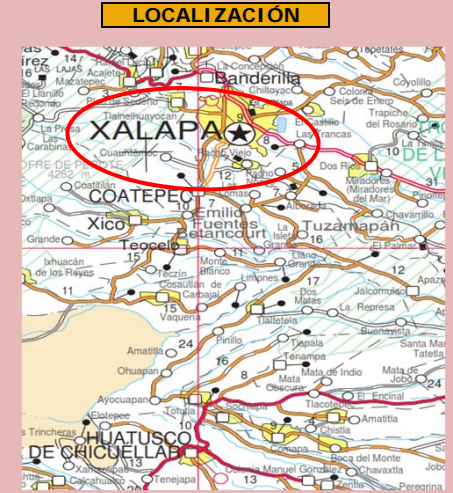

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** XALAPA

**LOCALIDAD** XALAPA

**REGIÓN** CAPITAL

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
SIOP-OP-PE-111/2021-DGCOP

**AUTORIZADO 2023** \$ 26,519,130.11

**COSTO DEL CONTRATO** \$ 94,561,722.36

**AVANCES**

**AVANCE FÍSICO U.P.** 98.14%

**AVANCE FINANCIERO** 98.14%

**TRAMITADO HASTA 2022** \$ 68,042,592.25

**UNIDAD EJECUTORA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

**TRAMITADO EN 2023** \$ 24,761,675.17

**POR TRAMITAR** \$ 1,757,454.94

**FECHA DE CORTE** 31 DE AGOSTO DE 2023



**METAS**  
PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ESCALERAS Y ELEVADOR, ACABADOS, SEÑALÉTICA, HERRERÍA, CANCELERÍA, JARDINERÍA, CISTERNA, ELÉCTRICO, HIDROSANITARIOS, PLUVIAL, RED CONTRAINCENDIO, VOZ Y DATOS, CORRIENTE REGULADA, INSTALACIONES ESPECIALES, MEDIA TENSIÓN, AIRE ACONDICIONADO.
