

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, LAGUNA DE LIXIVIADOS Y CASETA PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ

NO. DE OBRA

0248202200007

LOCALIZACIÓN

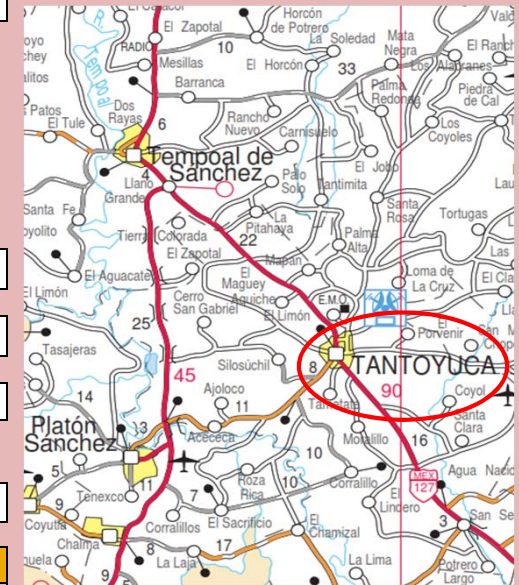

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TANTOYUCA

LOCALIDAD

TANTOYUCA

REGIÓN

HUASTECA ALTA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

PMA/HIDROTERRESTRES/0248202200007

COSTO DEL CONTRATO

\$ 38,116,292.21

AUTORIZADO 2023

\$ 38,116,292.21

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

65.00%

AVANCE FINANCIERO

50.80%

TRAMITADO EN 2023

\$ 19,361,413.25

UNIDAD EJECUTORA

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

POR TRAMITAR

\$ 18,754,878.96

FECHA DE CORTE

31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

RELLENO SANITARIO (PRELIMINARES, CERCA PERIMETRAL, EXCAVACIONES PARA CELDAS, ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS, ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS), OBRAS COMPLEMENTARIAS (CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE FOSA SÉPTICA, SISTEMA DE OXIDACIÓN DEL EFLUENTE, POZO DE ABSORCIÓN), DRENAJES COMPLEMENTARIOS, CONTROL DE GASES, BASCULA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA, OFICINAS, VESTIDORES Y ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUYE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, Y SANITARIA).

