


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRISTÓBAL HIDALGO - CUAUTITLÁN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710.

NO. DE OBRA
04842022000080

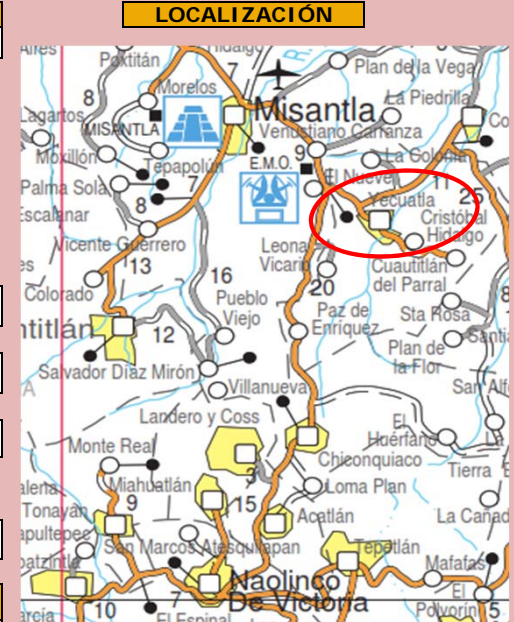

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO YECUATLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-057/2022-DGCCYCE

REGIÓN NAUTLA

COSTO DEL CONTRATO \$ 40,000,000.00

AUTORIZADO 2023 \$ 40,000,000.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 94.91%

AVANCE FINANCIERO 94.91%

TRAMITADO EN 2023 \$ 37,962,502.53

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR \$ 2,037,497.47

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

METAS
TERRACERÍAS (CORTES, EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE TERRAPLÉN, CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, CUNETAS Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BORDILLO DE CONCRETO), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA, MEMBRANA DE POLIETILENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO), SEÑALAMIENTO.

