


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PLAYA VICENTE - ISLA, DEL KM 10+260 AL KM 24+930.

NO. DE OBRA
04842023000020

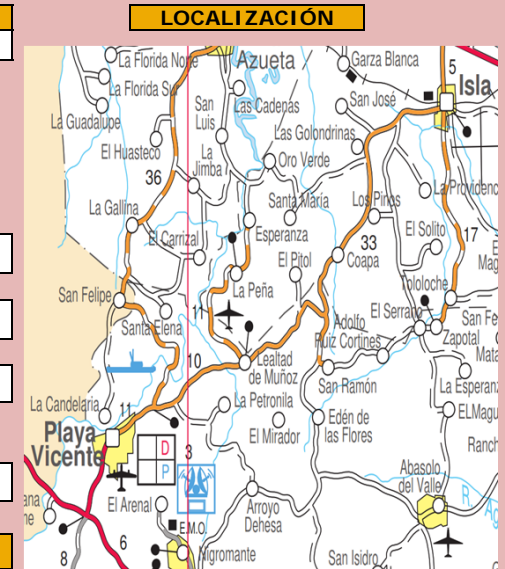

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	VARIOS
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-013/2023-DGCCYCE

LOCALIDAD	VARIAS
-----------	--------

REGIÓN	PAPALOAPAN
--------	------------

COSTO DEL CONTRATO	\$	94,615,675.02
--------------------	----	---------------

AUTORIZADO 2023	\$	94,615,675.02
-----------------	----	---------------

**AVANCES**

AVANCE FÍSICO U.P.	39.04%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	39.04%
-------------------	--------

TRAMITADO EN 2023	\$	36,940,428.24
-------------------	----	---------------

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR	\$	57,675,246.78
--------------	----	---------------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------

METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE RELLENO), ESTRUCTURA (ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, DESMANTELAMIENTO DE TUBO DE LÁMINA), DRENAJE (ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO, CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CAPA DRENANTE CON MATERIAL GRANULAR, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO DE CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA), SEÑALAMIENTO (RAYA CONTINUA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS REFLEJANTES, SEÑALES PREVENTIVA E INFORMATIVA).

