


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**OBRA**  
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL VERACRUZANA.

**NO. DE OBRA**  
02082022000006

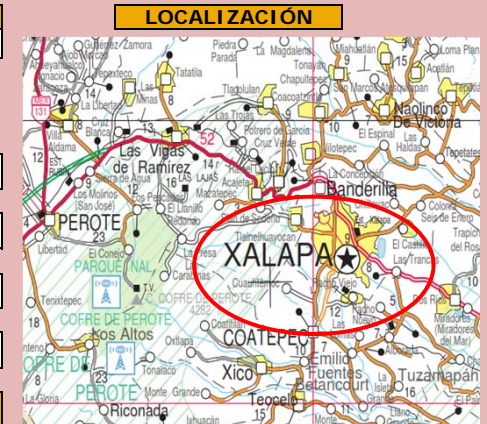

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** XALAPA

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
IEEV-FAMS-2022-028

**LOCALIDAD** XALAPA-ENRÍQUEZ

**COSTO DEL CONTRATO** \$ 7,994,521.98

**REGIÓN** CAPITAL

**AUTORIZADO 2023** \$ 6,380,731.52

**AVANCES**

**AVANCE FÍSICO U.P.** 89.00%

**AVANCE FINANCIERO** 51.32%

**TRAMITADO HASTA 2022** \$ 1,613,790.46

**UNIDAD EJECUTORA**  
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

**TRAMITADO EN 2023** \$ 2,489,072.69

**POR TRAMITAR** \$ 3,891,658.83

**FECHA DE CORTE** 31 DE AGOSTO DE 2023



**METAS**  
FINO A BASE DE MORTERO, COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA VITRIFICADA, PINTURA VINÍLICA LAVABLE, PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METÁLICA, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, RESANE DE GRIETAS EN TRABES, MUROS Y LOSAS, COLOCACIÓN DE CAJAS DE PVC PARA AHOGAR EN PISO, COLOCACIÓN DE GABINETE TIPO REGISTRO, SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERCOMPACTA CON BALASTRO ELECTRÓNICO Y LUMINARIO DE SOBREPONER, COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DE REGULADOR DE VOLTAJE, DE CENTRO DE CARGA, DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, DE TUBO CONDUIT DE PVC Y FIERRO, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, BARDA PERIMETRAL.
