

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**OBRA**

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

CONTRATO

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**

CAEV-CRE-2021-E10-LPE

CAEV-CRE-2021-E14-LPE

CAEV-HIDROTERRESTRES-HIDROMARÍTIMAS R  
2019-2020-2021-F35-INV


**CONTRATADO** \$ 314,485,007.61

**AUTORIZADO 2023** \$ 102,035,116.77

**NOS. DE OBRA**

02492021000038  
02492022000099  
02492021000039  
02492021000089  
02492021000111  
02492021091111  
02492021092111  
02492021093111  
02492021094111  
02492022091099  
02492022000107

**LOCALIZACIÓN**

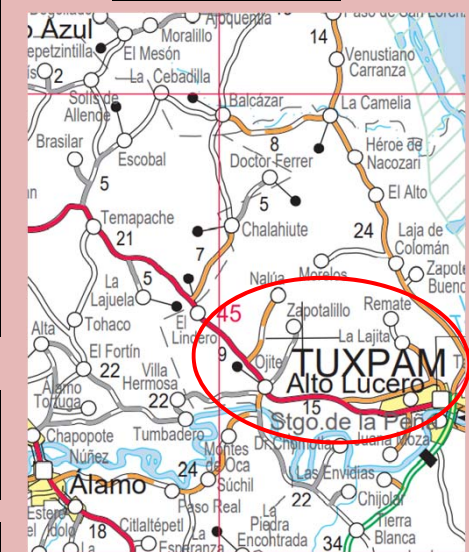

**MUNICIPIO** TUXPAM  
**LOCALIDAD** VARIAS  
**REGIÓN** TOTONACA

**AVANCES**

**AVANCE FÍSICO U.P.** 95.00%

**TRAMITADO HASTA 2022** \$ 212,449,890.84

**TRAMITADO EN 2023** \$ 73,153,515.23

**POR TRAMITAR** \$ 28,881,601.54

**FECHA DE CORTE** 31 DE AGOSTO DE 2023

**AVANCE FINANCIERO** 90.82%

**UNIDAD EJECUTORA**

**COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ**

**METAS**

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, SISTEMA DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, EQUIPAMIENTO Y OBRA HIDRÁULICA, PRESEDIMENTADORES, FLOCULACIÓN, CLARIFICACIÓN, FILTROS RÁPIDOS, RETROLAVADO, EQUIPAMIENTO CUARTO DE REACTIVOS, PRODUCTO TERMINADO, OBRA CIVIL E HIDRÁULICA, EQUIPAMIENTO.

