


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**OBRA**  
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.

**NO. DE OBRA**  
02492021000003  
02492021000091  
02492022000035

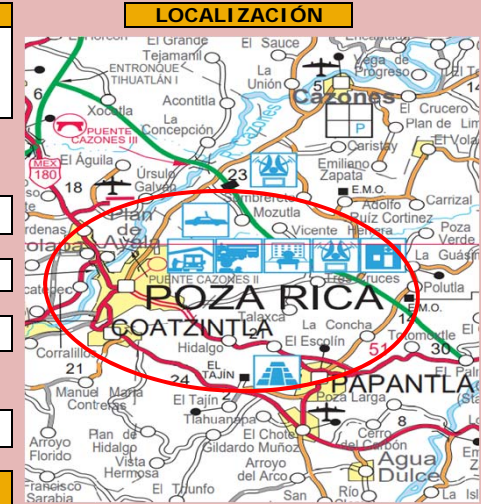

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**  
CONTRATO

**MUNICIPIO** POZA RICA

**NÚMERO DE CONTRATOS(S)**  
CAEV-FISE-2021-E06-LPE

**LOCALIDAD** POZA RICA

**REGIÓN** TOTONACA

**CONTRATADO** \$ 363,032,429.54

**AUTORIZADO 2023** \$ 60,133,036.09

**AVANCES**

**AVANCE FÍSICO U.P.** 97.00%

**AVANCE FINANCIERO** 97.00%

**TRAMITADO HASTA 2022** \$ 302,899,393.45

**UNIDAD EJECUTORA**  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

**TRAMITADO EN 2023** \$ 50,400,693.60

**POR TRAMITAR** \$ 9,732,342.49

**FECHA DE CORTE** 31 DE AGOSTO DE 2023

**METAS**  
OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN MÓDULO I Y MÓDULO II (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN), RELLENO DE ZANJAS (DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN), FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACIÓN DE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, TECHUMBRE POLIPASTOS, CAJAS DE VÁLVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y FACHADA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE FILTROS, CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO MÓDULO I Y II, INTERCONEXIONES.

