


**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

OBRA
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

NO. DE OBRA
02482022000009

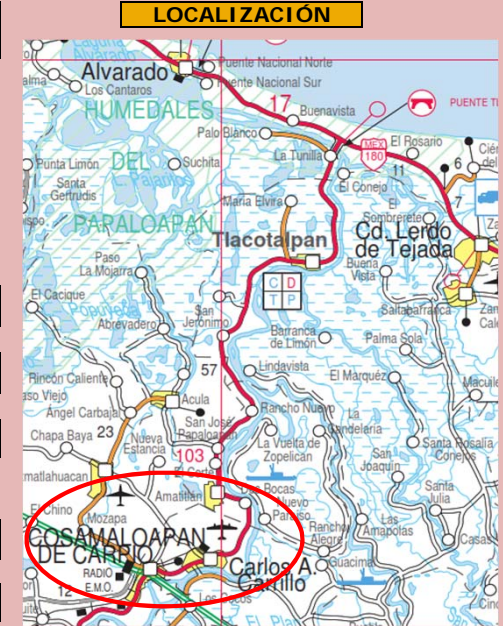

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	COSAMALOAPAN
-----------	--------------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
PMA/HIDROTERRESTRES/02482022000009

LOCALIDAD	COSAMALOAPAN
-----------	--------------

REGIÓN	PAPALOAPAN
--------	------------

COSTO DEL CONTRATO	\$	34,732,759.28
--------------------	----	---------------

AUTORIZADO 2023	\$	34,732,759.28
-----------------	----	---------------

**AVANCES**

AVANCE FÍSICO U.P.	95.00%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	74.04%
-------------------	--------

TRAMITADO EN 2023	\$	25,715,304.80
-------------------	----	---------------

**UNIDAD EJECUTORA**  
**PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

POR TRAMITAR	\$	9,017,454.48
--------------	----	--------------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------

**METAS**  
LIMPIEZA Y DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA VIALIDAD, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BAÑOS Y VESTIDORES (PRELIMINARES, OBRA CIVIL EXTERIOR, CUBIERTA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS, BIODIGESTOR, CISTERNA, LIMPIEZA), CASETA DE VIGILANCIA (PRELIMINARES, OBRA CIVIL, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, LIMPIEZA), BODEGA DE HERRAMIENTAS (CIMENTACIÓN, OBRA CIVIL, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), COBERTIZO Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE NAVE INDUSTRIAL, SISTEMA DE LIXIVIADOS DE CELDA, POZA DE ALMACENAMIENTOS DE LIXIVIADOS, ETC.

