

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD, EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO), SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA, EL COYOL, EL MEZQUITE MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.

NO. DE OBRA

02492018000098

LOCALIZACIÓN

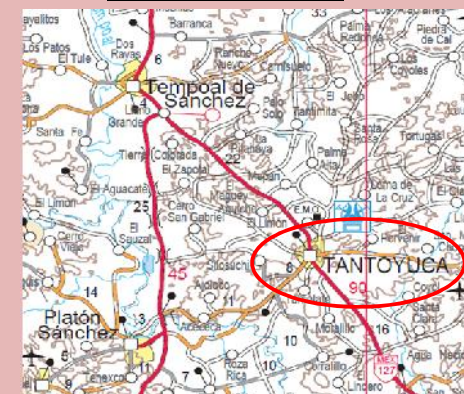

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TANTOYUCA

LOCALIDAD

VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FONREGIÓN-2018-15-LP

REGIÓN

HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO

\$ 24,683,024.07

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

76.00%

AVANCE FINANCIERO

71.30%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 24,683,024.07

UNI DAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2019

\$ 17,599,346.49

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS

LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 1, TANQUE SUP. DE 50 M3 (REBOMBEO 1), SISTEMAS DE: SANTA CLARA, SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA Y EL COYOL, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL REBOMBEO 2, TANQUE SUP. DE 30 M3 (REBOMBEO 2), SISTEMAS DE MEZQUITE, MANO DE LEÓN, SANTA RITA, SAN JERÓNIMO, EL AGUACATE, LA ESPERANZA, SANTA CLARA, CRUCERO PALMITO, LÍNEAS DE DERIVACIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS, FONTANERÍA, CÁRCAMO, REBOMBEO 1 Y 2 E HINCADO HORIZONTAL.

