


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492022000038
02492023000044

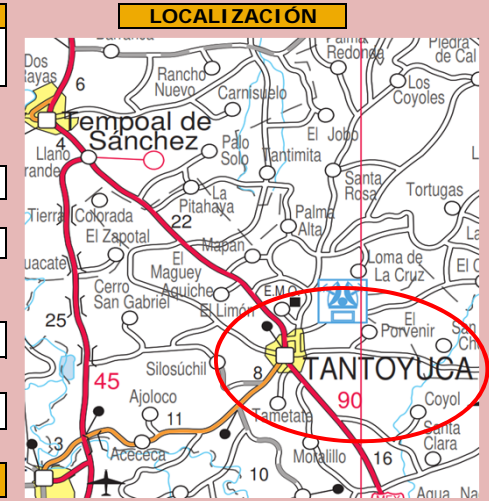

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	TANTOYUCA
-----------	-----------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2022-F02-LP
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2023-F03-LP

LOCALIDAD	IXCANELCO
-----------	-----------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 47,388,234.81
--------------------	------------------

REGIÓN	HUASTECA ALTA
--------	---------------

AUTORIZADO 2023	\$ 33,315,620.23
-----------------	------------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	69.24%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	69.24%
-------------------	--------

TRAMITADO HASTA 2022	\$ 14,072,614.58
----------------------	------------------

UNIDAD EJECUTORA	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
------------------	--

TRAMITADO EN 2023	\$ 18,737,221.97
-------------------	------------------

POR TRAMITAR	\$ 14,578,398.26
--------------	------------------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------

METAS
RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC Y DE ACERO SOLDADA, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN), COLECTOR, EMISOR, MADRINAS SANITARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS,

