


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
RESCATE DEL RIO NAOLINCO MEDIANTE TRATAMIENTO ECOLÓGICO.

NO. DE OBRA
01822022000008

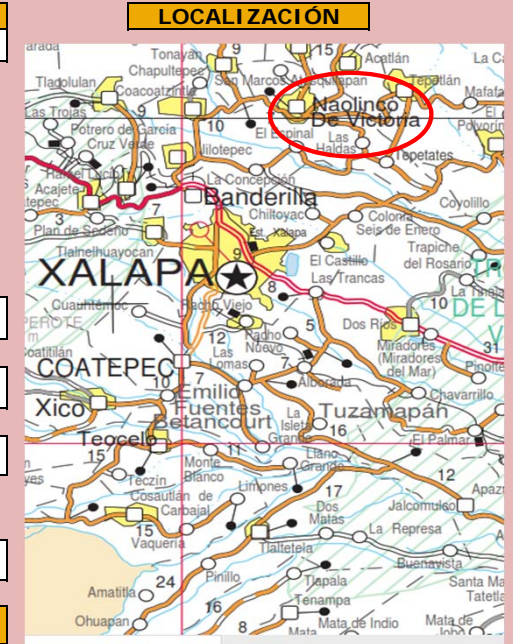

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	NAOLINCO
-----------	----------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
LO-02-2022

LOCALIDAD	NAOLINCO
-----------	----------

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

COSTO DEL CONTRATO	\$	6,323,687.68
--------------------	----	--------------

AUTORIZADO 2023	\$	6,323,687.68
-----------------	----	--------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	50.00%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	47.12%
-------------------	--------

TRAMITADO EN 2023	\$	2,979,830.79
-------------------	----	--------------

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------	------------------------------

POR TRAMITAR	\$	3,343,856.89
--------------	----	--------------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------

METAS
PROYECTO DE HUMEDALES, PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA REDES EN URBANIZACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO Y CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMIÓN PRIMER KILÓMETRO, CAMA DE ARENA DE TEPETATE, RELLENO EN CEPAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES), REHABILITACIÓN DE SEDIMENTADOR (LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, APLANADO FINO EN MUROS, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO), CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CADENA DE DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO, SEMBRADO DE PLANTAS ACUÁTICAS DE LA REGIÓN, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA).

