


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM. 9+000 AL KM. 18+000.

NO. DE OBRA
04842018000126

LOCALIZACIÓN

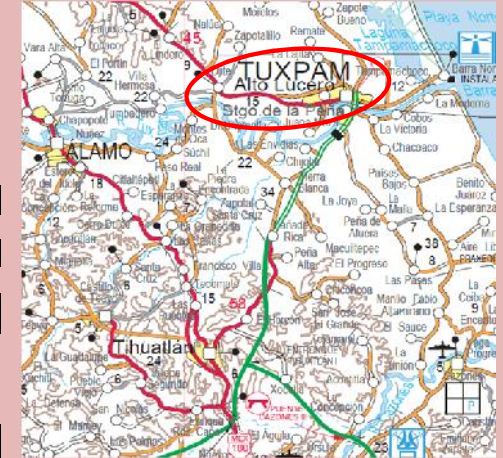

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TUXPAN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-142/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 42,697,771.70

REGIÓN HUASTECA BAJA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018 \$ 42,697,284.87

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO EN 2019 \$ 486.83

DEVENGADO EN 2019 \$ -

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO EN CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE, SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO), SEÑALAMIENTO (PINTURA DE RAYA SENCILLA Y DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES Y CONTINUA EN ORILLA DE CALZADA), SEÑALES PREVENTIVA, RESTRICTIVA E INFORMATIVA.

