


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

NO. DE OBRA
04812021000148
04812023090039
04812023000039

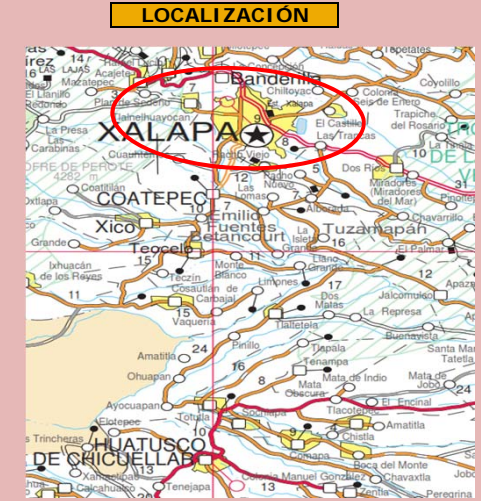

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO XALAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-114/2021-DGCOP

LOCALIDAD XALAPA

REGIÓN CAPITAL

COSTO DEL CONTRATO \$ 117,335,635.93

AUTORIZADO 2023 \$ 51,074,318.28

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 86.94%

AVANCE FINANCIERO 86.94%

TRAMITADO HASTA 2022 \$ 66,261,317.65

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

TRAMITADO EN 2023 \$ 35,748,155.38

POR TRAMITAR \$ 15,326,162.90

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023



METAS
PRELIMINARES, CASSETAS DE VIGILANCIA, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ACABADOS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTALES, ESTACIONAMIENTO, CISTERNA, ESTRUCTURA SÓTANO Y SIETE NIVELES Y AZOTEA, ELEVADOR, ESCALERA, ESCALERA DE EMERGENCIA, PISOS, MUROS, PLAFÓN TODOS LOS NIVELES, VENTANAS, FACHADA SEV Y FACHADA PROTECCIÓN CIVIL, OBRA EXTERIOR, ÁREAS VARIAS, MUEBLES DE BAÑO TODOS LOS NIVELES, INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO, INSTALACIÓN PLUVIAL, PARARRAYOS, INSTALACIONES BAJA TENSIÓN, MEDIA Y ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO, OBRA CIVIL ELÉCTRICA, PLANTA EMERGENCIA, PANEL SOLAR.
