

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA LAGUNA DE LIXIVIADOS Y CASETA PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VERACRUZ

NO. DE OBRA

02482022000008

LOCALIZACIÓN

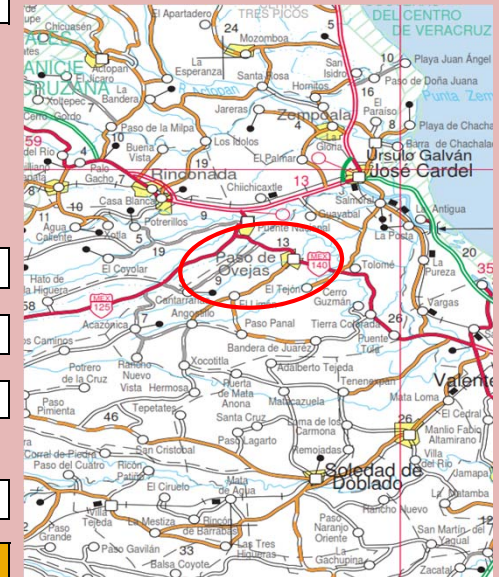

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

PASO DE OVEJAS

LOCALIDAD

PASO DE OVEJAS

REGIÓN

SOTAVENTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

PMA/HIDROTERRESTRES/02482022000008

COSTO DEL CONTRATO

\$ 38,571,213.05

AUTORIZADO 2023

\$ 38,571,213.05

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

45.00%

AVANCE FINANCIERO

48.95%

TRAMITADO EN 2023

\$ 18,879,288.52

UNIDAD EJECUTORA

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

POR TRAMITAR

\$ 19,691,924.53

FECHA DE CORTE

31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

RELLENO SANITARIO (PRELIMINARES, CERCA PERIMETRAL, EXCAVACIONES PARA CELDAS, ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS), OBRAS COMPLEMENTARIAS (CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE FOSA SÉPTICA, SISTEMA DE OXIDACIÓN DEL EFLUENTE, POZO DE ABSORCIÓN), DRENAJES COMPLEMENTARIOS, CONTROL DE GASES, BÁSCULA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA, OFICINAS, VESTIDORES Y ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUYE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, Y SANITARIA).

