

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN DEL KM. 2+000 AL KM. 5+800.

NO. DE OBRA

04842022000003

LOCALIZACIÓN

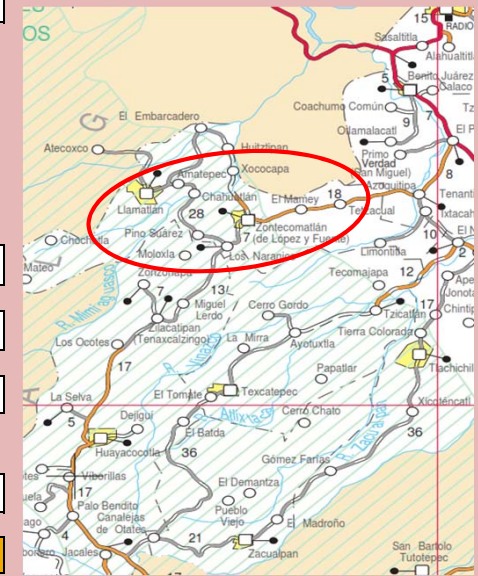

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

ILAMATLÁN

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

HUASTECA BAJA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-019/2022-DGCCYCE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 36,500,000.00

AUTORIZADO 2023

\$ 8,160,094.23

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

93.69%

AVANCE FINANCIERO

93.69%

TRAMITADO HASTA 2022

\$ 28,339,905.77

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

TRAMITADO EN 2023

\$ 5,858,563.19

POR TRAMITAR

\$ 2,301,531.04

FECHA DE CORTE

31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, CORTES, EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN Y CAPA SUBRASANTE), OBRA INDUCIDA (RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA CON MUROS DE TABIQUE, RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO), ESTRUCTURAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO), OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO, CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO, COLOCACIÓN DE MEMBRANA Y DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR), SEÑALAMIENTO.

