


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE "LAS TRES VILLAS" (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492021000004
02492021000037
02492021000088

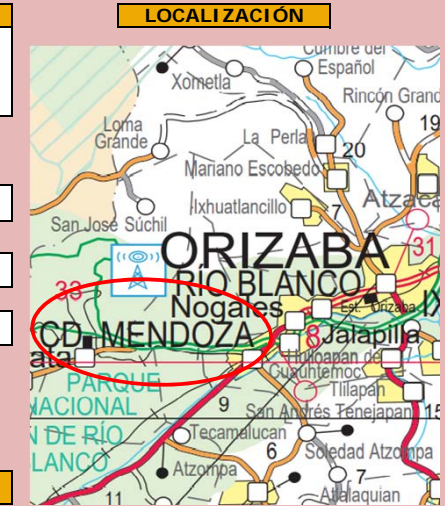

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	CAMERINO Z. MENDOZA
-----------	---------------------

LOCALIDAD	CIUDAD MENDOZA
-----------	----------------

REGIÓN	LAS MONTAÑAS
--------	--------------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2021-E04-LPE
CAEV-CRE-2021-E09-LPE
CAEV-CRE-2021-2022-E01-LP

AUTORIZADO 2023	\$ 21,442,753.01
-----------------	------------------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 164,271,782.47
--------------------	-------------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	100.00%
-------------------	---------

TRAMITADO HASTA 2022	\$ 142,829,029.46
----------------------	-------------------

UNIDAD EJECUTORA	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
------------------	------------------------------------------

TRAMITADO EN 2023	\$ 21,442,753.01
-------------------	------------------

POR TRAMITAR	\$ -
--------------	------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------



**PRIMERA, SEGUNDA
Y TERCERA ETAPA
TERMINADAS**

METAS
REHABILITACIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, TANQUE DE REGULACIÓN EL MIRADOR, ESTRUCTURA, PRELIMINARES, OBRA CIVIL TANQUE, CASETA DE CONTROLES CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL MIRADOR, ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, TOMAS DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCIÓN TANQUE EL MIRADOR, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TANQUE XICOTEPEC, CRUZAMIENTO DE DUCTO DE GAS EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL XICOTEPEC.
