

DATOS GENERALES DE LA OBRA


OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.

NO. DE OBRA

02082017000243

LOCALIZACIÓN

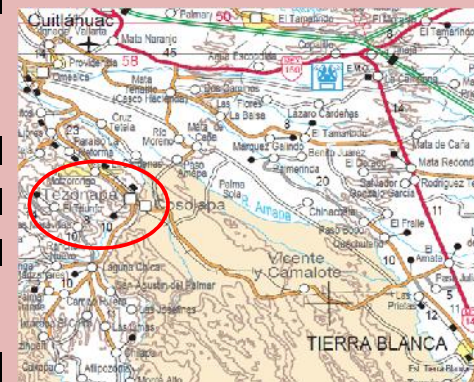

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

TEZONAPA

LOCALIDAD

TEZONAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

IEEV-FONR-134-17

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,796,610.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

56.00%

AVANCE FINANCIERO

46.55%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018

\$ 5,492,017.12

AUTORIZADO EN 2019

\$ 3,152,296.42

DEVENGADO EN 2019

\$ -

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO F (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN), OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MURO DE ACOMETIDA (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS), MEDIA TENSIÓN (CIMENTACIÓN, INSTALACIONES, ADHERIDOS, REHABILITACIÓN).



TERMINACIÓN ANTICIPADA
