


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500.

NO. DE OBRA
04842018000019

LOCALIZACIÓN

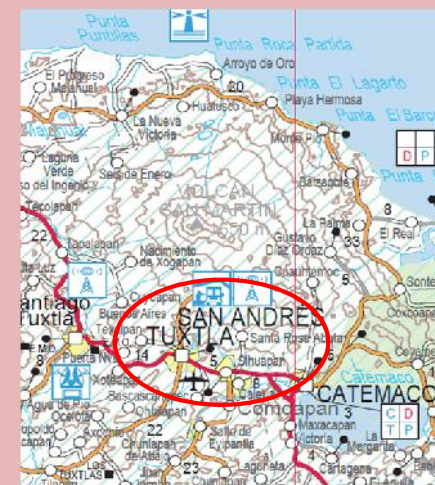

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO SAN ANDRÉS TUXTLA

LOCALIDAD VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-008/2018-DGCCYCE

REGIÓN LOS TUXTLAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 26,322,465.67

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2018 \$ 25,036,163.55

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO EN 2019 \$ 1,035,361.84

DEVENGADO EN 2019 \$ 1,035,361.84

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO PARA ESTRUCTURAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO, LIMPIEZA DE CUNETA, CUNETAS), PAVIMENTOS (RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR), SEÑALAMIENTO.

