


DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO.

NO. DE OBRA
04842023000033

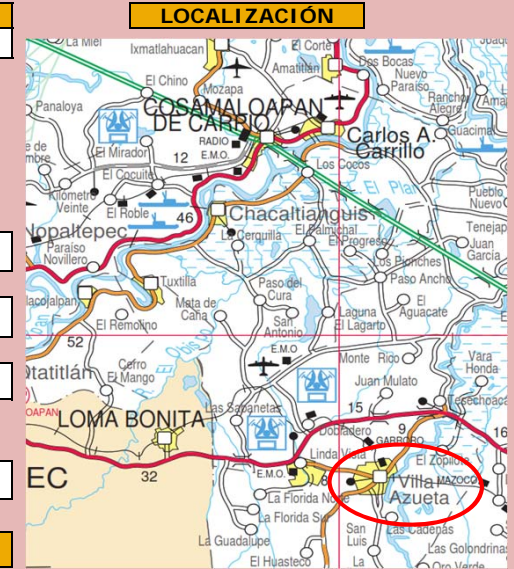

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	JOSÉ AZUETA
-----------	-------------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-006/2023-DGCCYCE

LOCALIDAD	VARIAS
-----------	--------

REGIÓN	PAPALOAPAN
--------	------------

COSTO DEL CONTRATO	\$	84,490,395.11
--------------------	----	---------------

AUTORIZADO 2023	\$	84,490,395.11
-----------------	----	---------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	43.73%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	43.73%
-------------------	--------

TRAMITADO EN 2023	\$	36,946,026.05
-------------------	----	---------------

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
------------------	--

POR TRAMITAR	\$	47,544,369.06
--------------	----	---------------

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023
----------------	----------------------

METAS
TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, DESPALME DE 0.20 METROS DE ESPESOR, CORTES EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CENTÍMETROS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN), ESTRUCTURAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACERO DE REFUERZO Y TRABE PREFABRICADA, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, PILOTES DE CIMENTACIÓN DE 1.20 METROS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN), DRENAJE Y SUBDRENAJE (COLOCACIÓN DE DRENES DE PVC), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE HIDRÁULICA DE 25 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), ACCESOS, SEÑALAMIENTO.

